



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze



12/12/2023

**DIPARTIMENTO PER LO SPORT IN COLLABORAZIONE CON MEF E ANCI**

**M5C2.Inv3.1 Sport e inclusione sociale – Terza linea di intervento**

**WEBINAR** istruzioni per l'utilizzo del sistema informatico Regis

# PREMESSA - LA COMUNICAZIONE NEI PROGETTI PNRR

- [Dipartimento per lo Sport - Obblighi di comunicazione - Avviso del 24 ottobre 2022 \(governo.it\)](#)
- [linee-guida-comunicazione-pnrr-febbraio-2023\\_rev1-002.pdf \(governo.it\)](#)

## IL LOGO FIRMA DEL PNRR



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

## DIMENSIONI MINIME



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

85 mm

## DISTANZA DI RISPETTO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**



eventuale  
logo di progetto

## REALIZZAZIONI



# ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO REGIS

## Agenda dei lavori

1. PROFILAZIONE UTENZE RISPETTO ALLE EVENTUALI CRITICITA' (Sondaggi in tempo reale per Accesso ReGis-riconoscimento CUP etc)
2. IMPLEMENTAZIONE DATI DI REGIS – (TRAMITE UN ACCESSO UTENTE DEMO CON FUNZIONALITA'- SOGGETTO ATTUATORE)



# ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO REGIS

---

PROFILAZIONE UTENZE RISPETTO ALLE EVENTUALI CRITICITA'

IL QUESTIONARIO:



**Dipartimento  
per lo sport**

TERZA LINEA DI INTERVENTO - Webinar  
12/12/2023 implementazione dati sulla  
piattaforma ReGis

***CLICCA QUI***

per procedere alla compilazione del questionario

**SOGGETTO  
ATTUATORE**



## **SEZIONE ANAGRAFICA**

- Anagrafica Progetto - Indicatori
- Cronoprogramma/costi
- Procedura aggiudicazione
- Gestione spese
- Gestione Fonti



**SOGGETTO  
ATTUATORE**




## **SEZIONE RENDICONTAZIONE**



**DIPARTIMENTO  
SPORT**



## FASE 1 – Anagrafica di progetto e Indicatori

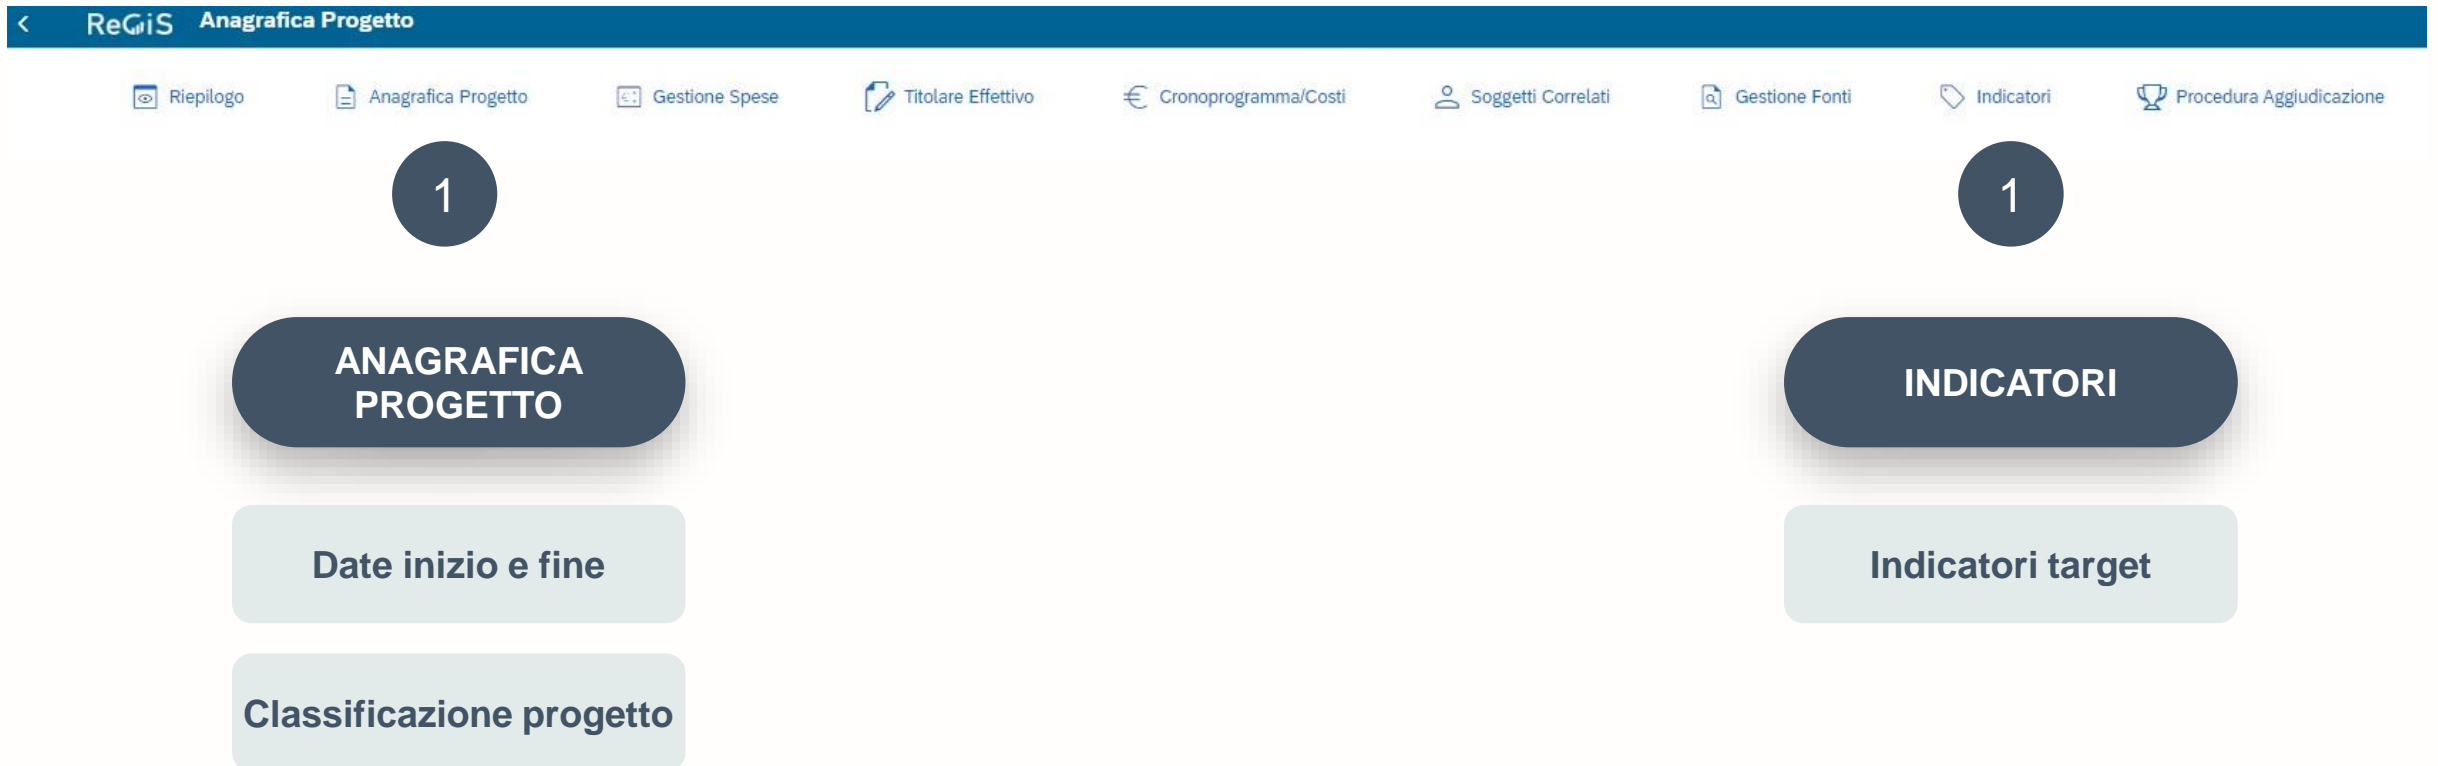



## AZIONE 1

Compilare le **date inizio e fine previste e effettive**

## Doc. necessari

Nessuna documentazione necessaria

## AZIONE 2

Compilazione della **classificazione progetto**

## Doc. necessari

Nessuna documentazione necessaria

## ▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:\*

22/03/2023

Data fine prevista:\*

10/08/2023

Data inizio effettiva

22/03/2023

Data fine effettiva

10/08/2023

## ▼ Classificazione Progetto

Tipologia e descrizione classificazione progetto ↑↓

Valore e descrizione classificazione progetto ↑↓

03 - TIPOLOGIA DI TERRITORIO

018 - SUD ITALIA

In relazione alla sezione **ASSOCIAZIONE TAG E ALTRE CLASSIFICAZIONI** si raccomanda di non associare il progetto a nessuno dei TAG elencati, in quanto non pertengono l'investimento finanziato dalla Terza linea di intervento



## AZIONE 3

Compilare l'**indicatore comune** con la dicitura – Motivazione – **INDICATORE NON PERTINENTE**

Compilare l'**indicatore target T0045** con il valore programmato e solo a conclusione dell'intervento il valore realizzato

Compilare l'**indicatore target T0157** con il valore realizzato 1 solo a conclusione dell'intervento

Indicatori comuni

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Codice Misura ↑↓	Motivazione ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Tipologia Stock/Flusso ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Allegati ↑↓
C1 - RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA	M5C2I3.1-Progetto Sport e inclusione sociale	INDICATORE NON PERTINENTE	MWh/anno	Stock	0.00	0.00	Allegati (0)

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

Indicatore ↑↓	Descrizione Indicatore ↑↓	Motivazione e ↑↓	Valore programmato ↑↓	Valore Realizzato ↑↓	Unità di Misura ↑↓	Target Associati ↑↓	Pianificazione ↑↓	Allegati ↑↓
T0045 - MQ DI SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO	Ciascun Soggetto Attuatore dovrà validare il campo inserendo l'area coperta dall'intervento		900.00	900.00	Metri quadrati	Visualizza dettaglio Target Ass.		Allegati (0)
T0157 - NR. DI INTERVENTI/PROGETTI COMPLETATI	Numero di progetti che dispongono di certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori (ove consentito).		1.00	1.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.		Allegati (0)



## FASE 2 – Cronoprogramma/costi





AZIONE 4

ITER DI PROGETTO - Compilare le **date inizio e fine previste e effettive** di ogni fase e inserire i relativi allegati

Doc. necessari

FASE 103 – AGGIUDICAZIONE	Determina di aggiudicazione
FASE 104 – STIPULA CONTRATTO	<b>Clausole contrattuali</b> contenute nella lettera invito e/o nell’ordinativo MEPA, accettate dal Fornitore <b>Contratto di fornitura</b> , se stipulato, <b>ovvero atto equivalente</b>
FASE 105 – ESECUZIONE FORNITURA	<b>Planimetria</b> riportante il perimetro dell’area delle attrezzature, indirizzo e coordinate <b>Relazione</b> completa <b>di foto a corredo</b>
FASE 106 – COLLAUDO	<b>Certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione, Check list ex-post DNSH, Report conclusivo Disabilità, attestazione conclusione intervento (allegato 4)</b> , debitamente sottoscritti dal RUP

Iter di Progetto

Fase procedurale	Fase Obbligatoria	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00101 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00102 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						Allegati (0)
00103 - AGGIUDICAZIONE		30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	Allegati (6)
00104 - STIPULA CONTRATTO		03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	Allegati (1)
00105 - ESECUZIONE FORNITURA		03/04/2023	09/08/2023	03/04/2023	09/08/2023	Allegati (5)
00106 - COLLAUDO		09/08/2023	10/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	Allegati (5)

## AZIONE 4

ITER DI PROGETTO - Compilare le **date inizio e fine previste e effettive** di ogni fase e inserire i relativi allegati

## Doc. necessari

FASE 203 – AGGIUDICAZIONE

**Determina di aggiudicazione**

FASE 204 – STIPULA CONTRATTO

**Clausole contrattuali** contenute nella lettera invito e/o nell'ordinativo MEPA, accettate dal Fornitore  
**Contratto di fornitura**, se stipulato, **ovvero atto equivalente**

FASE 205 – ESECUZIONE FORNITURA

**Planimetria** riportante il perimetro dell'area delle attrezzature, indirizzo e coordinate  
**Relazione** completa **di foto a corredo**

FASE 206 – COLLAUDO

**Certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione, Check list ex-post DNSH, Report conclusivo**  
**Disabilità, attestazione conclusione intervento (allegato 4)**, debitamente sottoscritti dal RUP

## ✓ Iter di Progetto

Fase procedurale ↑↓	Fase Obbligatoria ↑↓	Data Inizio Prevista ↑↓	Data Fine Prevista ↑↓	Data Inizio Effettiva ↑↓	Data Fine Effettiva ↑↓	Allegati ↑↓
00201 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00202 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						Allegati (0)
00203 - AGGIUDICAZIONE		30/03/2023	30/06/2026	30/03/2023		Allegati (0)
00204 - STIPULA CONTRATTO		30/03/2023	30/06/2026	30/03/2023		Allegati (0)
00205 - ESECUZIONE FORNITURA		30/03/2023	30/06/2026	30/03/2023		Allegati (0)
00206 - COLLAUDO		30/03/2023	30/06/2026	30/03/2023		Allegati (0)

## AZIONE 4

**ITER DI PROGETTO** - Compilare le **date inizio e fine previste e effettive** di ogni fase e inserire i relativi allegati

## Doc. necessari

FASE 311 – AGGIUDICAZIONE

**Determina di aggiudicazione**

FASE 312 – STIPULA CONTRATTO

**Clausole contrattuali** contenute nella lettera invito e/o nell'ordinativo MEPA, accettate dal Fornitore  
**Contratto di fornitura**, se stipulato, **ovvero atto equivalente**

FASE 313 – ESECUZIONE LAVORI

**Planimetria** riportante il perimetro dell'area delle attrezzature, indirizzo e coordinate  
**Relazione** completa **di foto a corredo**

FASE 314 – COLLAUDO

**Certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione, Check list ex-post DNSH, Report conclusivo**  
**Disabilità, attestazione conclusione intervento (allegato 4)**, debitamente sottoscritti dal RUP

✓ Iter di Progetto

Fase procedurale ↑↓	Fase Obbligatoria ↑↓	Data Inizio Prevista ↑↓	Data Fine Prevista ↑↓	Data Inizio Effettiva ↑↓	Data Fine Effettiva ↑↓	Allegati ↑↓
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	Allegati (0)
00311 - AGGIUDICAZIONE	➔	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	Allegati (5)
00312 - STIPULA CONTRATTO	➔	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	Allegati (1)
00313 - ESECUZIONE LAVORI	➔	23/03/2023	27/06/2023	05/06/2023	27/06/2023	Allegati (4)
00314 - COLLAUDO	➔	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	Allegati (5)



## AZIONE 5

PIANO DEI COSTI - Aggiungere l'anno di riferimento e compilare gli importi da realizzare e realizzati

## Doc. necessari

Anno di riferimento

Nessun documento

Importo da realizzare nell'anno

Nessun documento

Importo realizzato nell'anno

Nessun documento

▼ Piano dei Costi

Tabella

Grafico

Scarica Excel

Cerca



Anno di riferimento ↑↓	Importo da realizzare nell'anno ↑↓	Importo realizzato nell'anno ↑↓	Allegati ↑↓
2023	28.499,20 €	0,00 €	Allegati (0)
28.499,20 €	28.499,20 €	0,00 €	





## AZIONE 6

QUADRO ECONOMICO – Aggiungere le tipologie voce di spesa e gli importi del QE **post affidamenti**

## NOTA

## Doc. necessari

101 – BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO

Nessun documento

103 - IVA

Eventuale dichiarazione IVA agevolata

100 - ALTRO

## ✓ Quadro economico

Tipologia voce spesa ↑↓	Importo ↑↓	Allegati ↑↓
00100 - ALTRO	365,99 €	Allegati (0)
00101 - BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO	23.060,66 €	Allegati (0)
00103 - IVA	5.073,35 €	Allegati (0)
	28.500,00 €	

## AZIONE 6

QUADRO ECONOMICO – Aggiungere le tipologie voce di spesa e gli importi del QE **post affidamenti**

## NOTA

## Doc. necessari

205 – SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)

Nessun documento

212 - IVA

Eventuale dichiarazione IVA agevolata

200 - ALTRO

## ✓ Quadro economico

Tipologia voce spesa ↑↓	Importo ↑↓	Allegati ↑↓
00205 - SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)	24.590,16 €	 Allegati (0)
00212 - IVA	5.409,84 €	 Allegati (0)
	30.000,00 €	

## AZIONE 6

QUADRO ECONOMICO – Aggiungere le tipologie voce di spesa e gli importi del QE **post affidamenti**

## NOTA

## Doc. necessari

303 –LAVORI

Nessun documento

308 - IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA


Eventuale dichiarazione IVA agevolata

300 - ALTRO

## ✓ Quadro economico

Tipologia voce spesa ↑↓	Importo ↑↓	Allegati ↑↓
00300 - ALTRO	36,61 €	 Allegati (0)
00303 - LAVORI	23.330,65 €	 Allegati (0)
00308 - IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	5.132,74 €	 Allegati (0)
	28.500,00 €	

## FASE 3 – Procedura di aggiudicazione

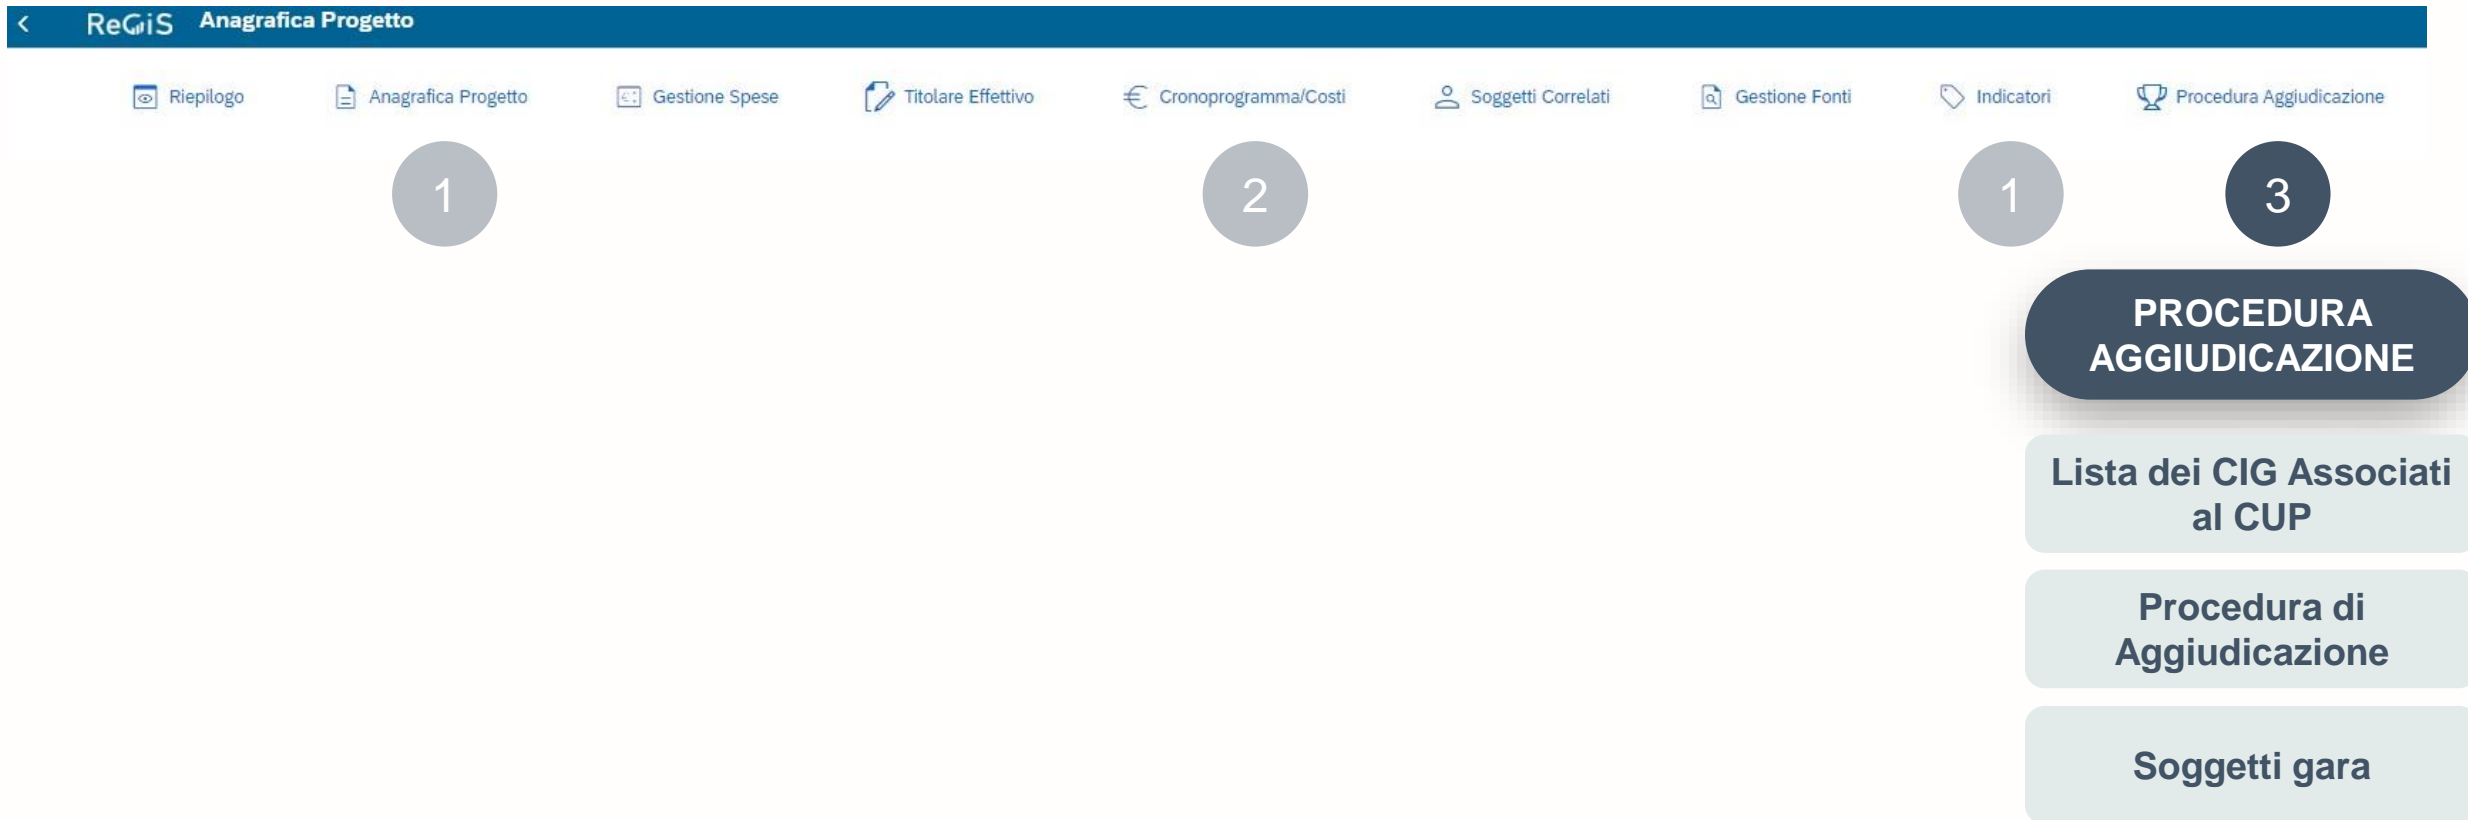



## AZIONE 7

LISTA DEI CIG ASSOCIATI AL CUP – verificare il CIG associato

## NOTA

NO SMART CIG (NON RENDICONTABILE) DA SOSTITUIRE CON CIG ORDINARIO

## Doc. necessari

Nessun documento

## ▼ Lista dei Cig Associati al CUP

⊕ Aggiungi Cig selezionato

Scarica Excel

Cerca



Cig ↑↓	Cig AQ ↑↓	Modalità Realizzazione ↑↓	Descrizione procedura di aggiudicazione ↑↓	Tipologia procedura di aggiudicazione ↑↓	Importo base d'asta € ↑↓	Data Pubblicazione ↑↓	Importo aggiudicato € ↑↓	Data Aggiudicazione definitiva ↑↓
9741855111		1 - CONTRATTO D'APPALTO	ATTREZZATURE PER LO SPORT E L'INCLUSIONE...	024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	23.360,65 €	28/03/2023	23.360,00 €	29/03/2023
					23.360,65 €		23.360,00 €	





## AZIONE 8

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – richiamare dall'azione 6 o aggiungere il CIG associato

## NOTA

NO SMART CIG (NON RENDICONTABILE) DA SOSTITUIRE CON CIG ORDINARIO

## Doc. necessari

## 1. Attestazione di gara firmata digitalmente (FOCUS AZIONE 9)

- Allegato-n-2\_checklist-verifica-affidamento
- Allegato-n-3\_checklist-verifica-ammissibilita-della-spesa
- Report previsionale Disabilità\_ Allegato A
- Scheda DNSH ex ante

Procedura di Aggiudicazione

Scarica Excel

Cerca



CIG ↑↓	Cig Accordo Quadro ↑↓	Codice Procedura ↑↓	Modalità Realizzazione ↑↓	Attestazione Gara ↑↓	Tipologia Procedura di Aggiudicazione ↑↓	Importo base d'asta € ↑↓	Data Pubblicazione ↑↓	Allegati ↑↓
9747417EF5			1 - CONTRATTO D'APPALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	024 - AFFIDAMENTO DIRETTO	23.360,65 €	30/03/2023	Allegati (11)
						23.360,65 €		

## AZIONE 9

Attestazione di gara firmata digitalmente

Caso applicativo in ReGis





## AZIONE 10

SOGGETTI GARA – verificare la compilazione automatica

## Doc. necessari

RUP

NESSUNA

STAZIONE APPALTANTE

NESSUNA

OPERATORE ECONOMICO/FORNITORE

NESSUNA

▼ Soggetti Gara


Scarica Excel

Cerca



CIG ↑↓	Codice procedura ↑↓	Soggetto ↑↓	Ruolo ↑↓	Aggiudicatario ↑↓	Forma Giuridica ↑↓	Forma Partecipazione ↑↓	Gruppo Partecipante ↑↓	Allegati
9736047825			INCARICATO (RUP)	No	Privato			Allegati (0)
9736047825			STAZIONE APPALTANTE	No	Comune			Allegati (0)
9736047825			NON CLASSIFICATO	Sì	Altra forma di ente privato con personalità giuridica	IMPRESA SINGOLA (IMPRENDITORI INDIVIDUALI, ANCHE ARTIGIANI, SOCIETA' COMMERCIALI, SOCIETA' COOPERATIVE)		Allegati (0)

## FASE 4 – Gestione fonti

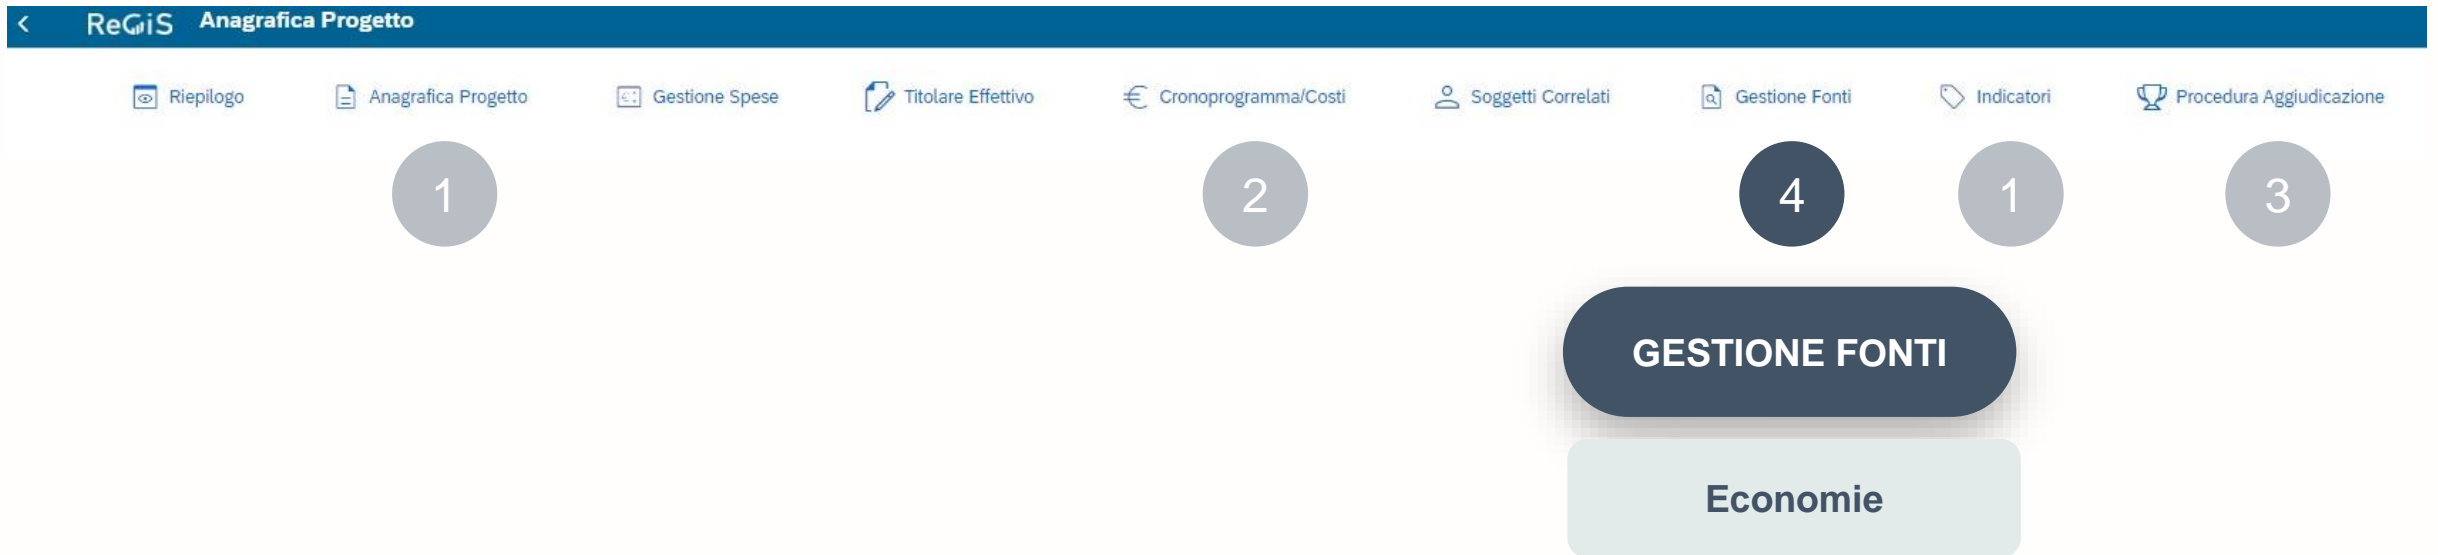



## AZIONE 11

**ECONOMIE** – Compilare la voce se a seguito di procedure di affidamento si ottengono delle economie da ribassi

## Doc. necessari

Nessun documento

## NOTA

Se si inseriscono le economie dovranno essere aggiornate le voci **Piano dei Costi** e **Quadro Economico**, sottraendo dai costi gli importi delle economie

▼ Economie




Scarica Excel

Cerca



Piano ↑↓	Codice Misura ↑↓	Amministrazione ↑↓	Fondo ↑↓	Importo fonte finanziaria Progetto ↑↓
PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza	M5C2I3.1-Progetto Sport e inclusione sociale	V315-PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	RRF-Recovery Fund	105,13 €
				105,13 €

## FASE 5 – Gestione spese

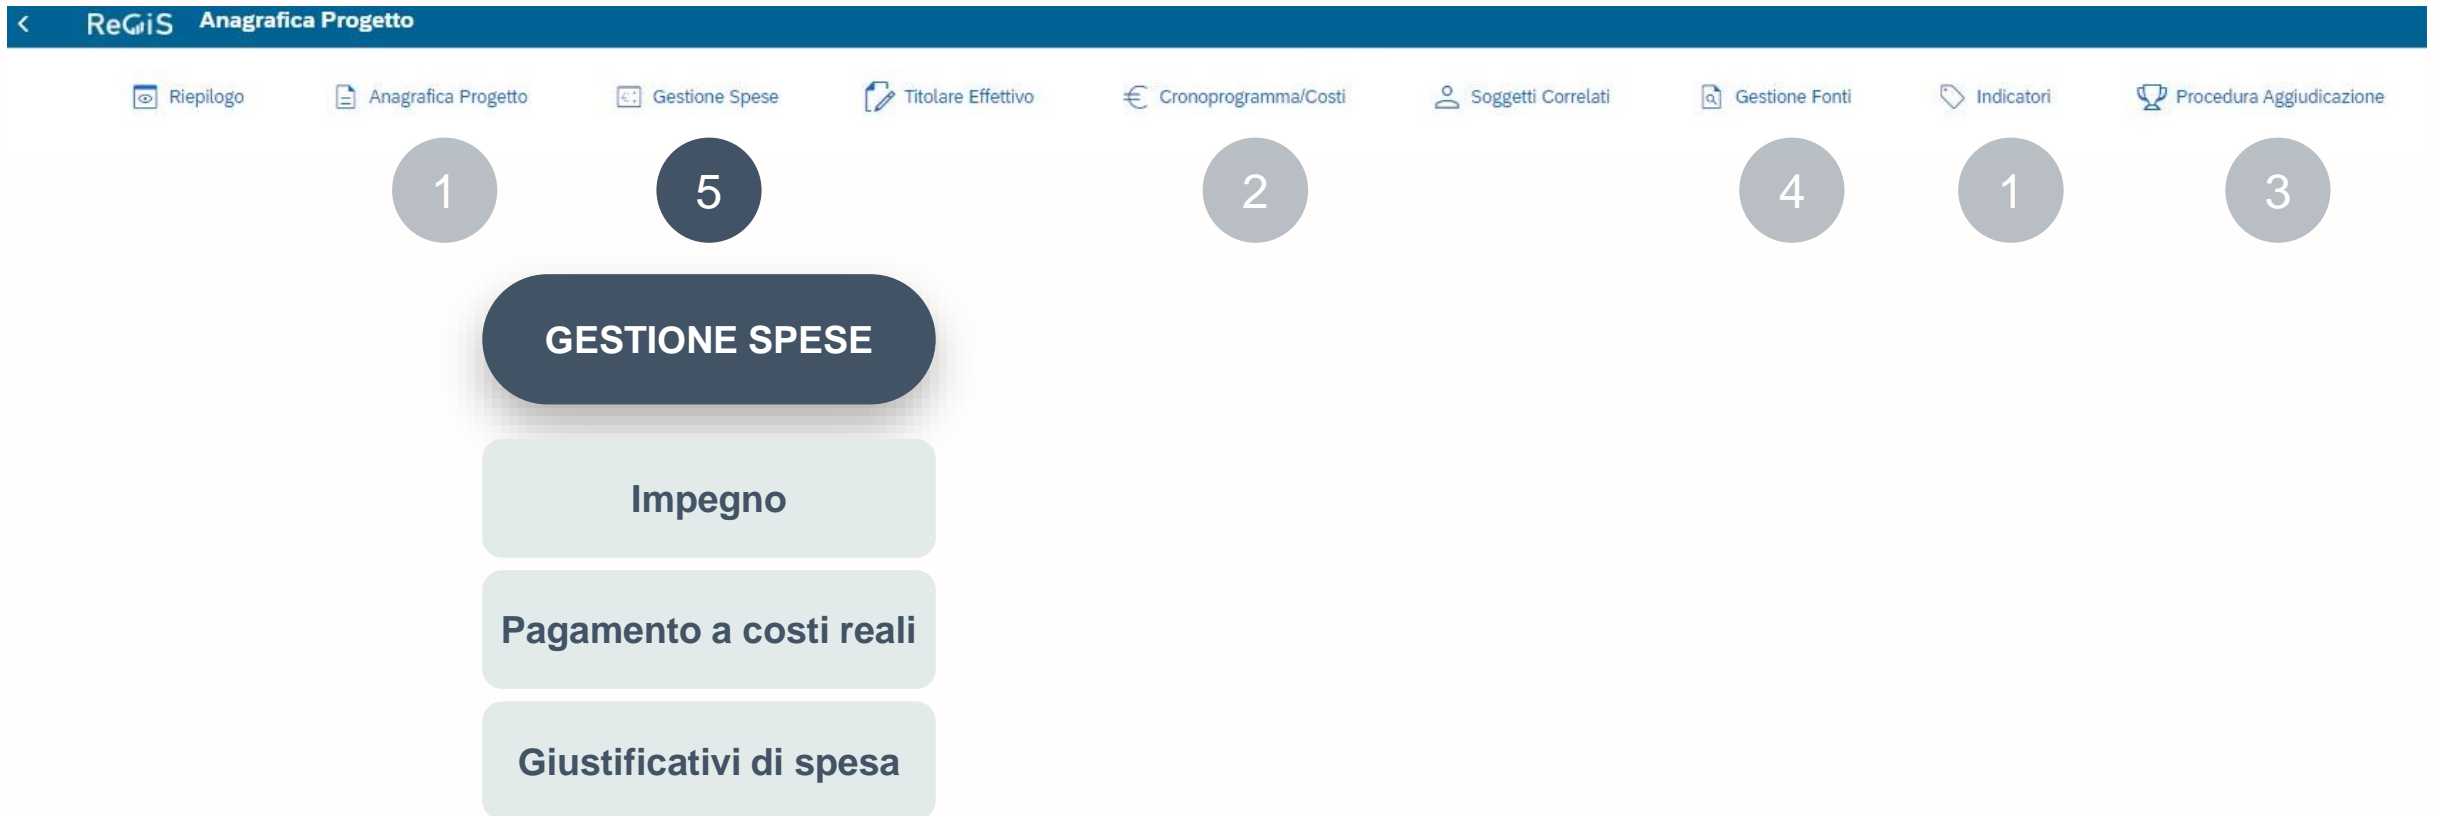





## AZIONE 12

## IMPEGNO – aggiungere l'impegno

## Doc. necessari

Impegno – Cod ID Esterno coincide con il CIG

NESSUNA

## Impegno

Scarica Excel

Cerca



Cod. ID Esterno	Tipologia	Data Impegno	Importo Impegno	Causale Disimpegno	Data Disimpegno	Importo Disimpegno	Allegati
1000168022	1 - Impegno	28/03/2023	28.487,00 €			0,00 €	Allegati (6)
			28.487,00 €				0,00 €

## Come individuare il Cod. ID Esterno

Impegno derivante da **procedura affidamento esterna**Impegno derivante da **affidamenti interni all'amministrazione**Impegno derivanti da **altri tipi di impegni**Inserire il **CIG**Inserire il testo **Interno**Inserire il testo **Altro**



## AZIONE 13

## PAGAMENTO A COSTI REALI – aggiungere il pagamento

## Doc. necessari

MANDATO

- Impegno
- Fattura
- Determina di liquidazione
- Mandato
- Quietanza di pagamento del mandato
- F24 riversamento IVA a Erario
- Altri giustificativi di spesa (\*)

## NOTA

Inserire/richiamare nella casella **Mandato** il numero di mandato effettivo

## ▼ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel

Cerca



Mandato	↑↓	Tipo Pagamento	↑↓	Indicazione voce di spesa	↑↓	Data pagamento	↑↓	Importo totale pagamento	↑↓	Importo richiesto	↑↓	IVA importo richiesto	↑↓	Importo Rendicontabile	↑↓	Allegati	↑↓
409		1 - Pagamento		Acconto		22/08/2023		1.721,31 €		1.721,31 €		0,00 €		0,00 €		Allegati (1)	>
409		1 - Pagamento		Iva		22/08/2023		378,69 €		378,69 €		378,69 €		0,00 €		Allegati (1)	>
								2.100,00 €		2.100,00 €		378,69 €		0,00 €			



## AZIONE 14

GIUSTIFICATIVI DI SPESA – aggiungere il pagamento richiamandola dalla sezione precedente

## Doc. necessari

MANDATO

Fattura originale (tracciato file xml, etc)  
Altri giustificativi (\*)

## NOTA

Inserire nella casella **Mandato** il Cod ID Esterno inserito nella sezione **Impegni**

Giustificativi Spesa

Scarica Excel

Cerca



Mandato ↑↓	Visualizza dettaglio fattura ↑↓	Data ↑↓	Importo totale netto ↑↓	Importo IVA ↑↓	CF/P.IVA del cedenteprestatore ↑↓	CF/P.IVA del Cessionario ↑↓	Allegati ↑↓
409	Dettaglio Fattura	22/08/2023	1.721,31 €	378,69 €	01732620305	00298080797	Allegati (4) >
			1.721,31 €	378,69 €			



## AZIONE 15

## RICHIESTA DI RIMBORSO



## Link utili

---

<https://www.sport.governo.it/it/pnrr/il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/>

<https://www.sport.governo.it/media/4347/istruzioni-terza-linea-di-intervento.pdf>

<https://www.sport.governo.it/it/pnrr/comunicazioni-ai-soggetti-attuatori/comunicazione-di-avvenuta-pubblicazione-della-manualistica-per-i-soggetti-attuatori/>

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\\_n\\_33\\_2022/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/)

<https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/pnrr-e-disabilita/la-direttiva/>
